

À AUBERVILLIERS,

nous remplaçons le
tablier du pont-rail
du RER **B**.



INFOLETTRE N°3
JUIN 2026

SNCF Réseau réalise des travaux de régénération du pont-rail situé au dessus du canal Saint Denis à Aubervilliers, **depuis le lundi 29 septembre 2025 jusqu'au samedi 31 octobre 2026.**

Ces opérations participent à l'amélioration de la performance de la ligne et au maintien d'un haut niveau de sécurité.

➤ QUELS BÉNÉFICES ?

Ces travaux vont permettre de rendre les installations ferroviaires :

+ performantes

+ résistantes

+ adaptées aux conditions climatiques



A compter du 13 juillet jusqu'au 4 septembre, fermeture du quai Jean Marie Tjibaou et de l'accès au quai via chemin Latéral Nord aux piétons et aux cyclistes
Retrouvez les informations à ce sujet dans cette infolettre.

Une question ?
Une remarque ?

Une adresse mail est dédiée au projet : pontsaintdenis@reseau.sncf.fr
N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE JOUR ET DE NUIT
 En semaine, de jour et de nuit de 21h00 à 05h00 et ponctuellement
 le week-end de jour : Depuis le lundi 04 mai 2026, jusqu'au
 vendredi 07 août 2026

1 Cette période marquera l'installation de la base travaux, le renforcement des appuis, l'installation de la grue, l'acheminement et la préfabrication des éléments.

TRAVAUX PRINCIPAUX EN CONTINU ET LE WEEK-END
 En continu, de jour et de nuit :
 - Du vendredi 07 août au soir au lundi 17 août 2026 matin
 Le week-end en continu :
 - Du vendredi 28 août au soir au lundi 31 août 2026 au matin

2 Cette période marquera le remplacement par grutage du tablier principal du pont-rail par 2 tabliers neufs, Les deux ponts encadrants seront également réhaussés.

CALENDRIER DES TRAVAUX 2025-2026




TRAVAUX DE FINITION DE JOUR ET DE NUIT
 En semaine, de nuit de 21h00 à 05h00 et ponctuellement le week-end de jour :
 - Du lundi 17 août au samedi 24 octobre 2026

3 Cette période marquera la fin du chantier avec les derniers détails des travaux ainsi que le replis de la base vie.

CARTES DES TRAVAUX 3 phases

Phase 2 - Mise en place de la grue, essais de grutage et repli des installations

- Du lundi 13 juillet au matin au vendredi 07 août au soir 2026
- Du dimanche 16 août au soir au vendredi 04 septembre après midi 2026

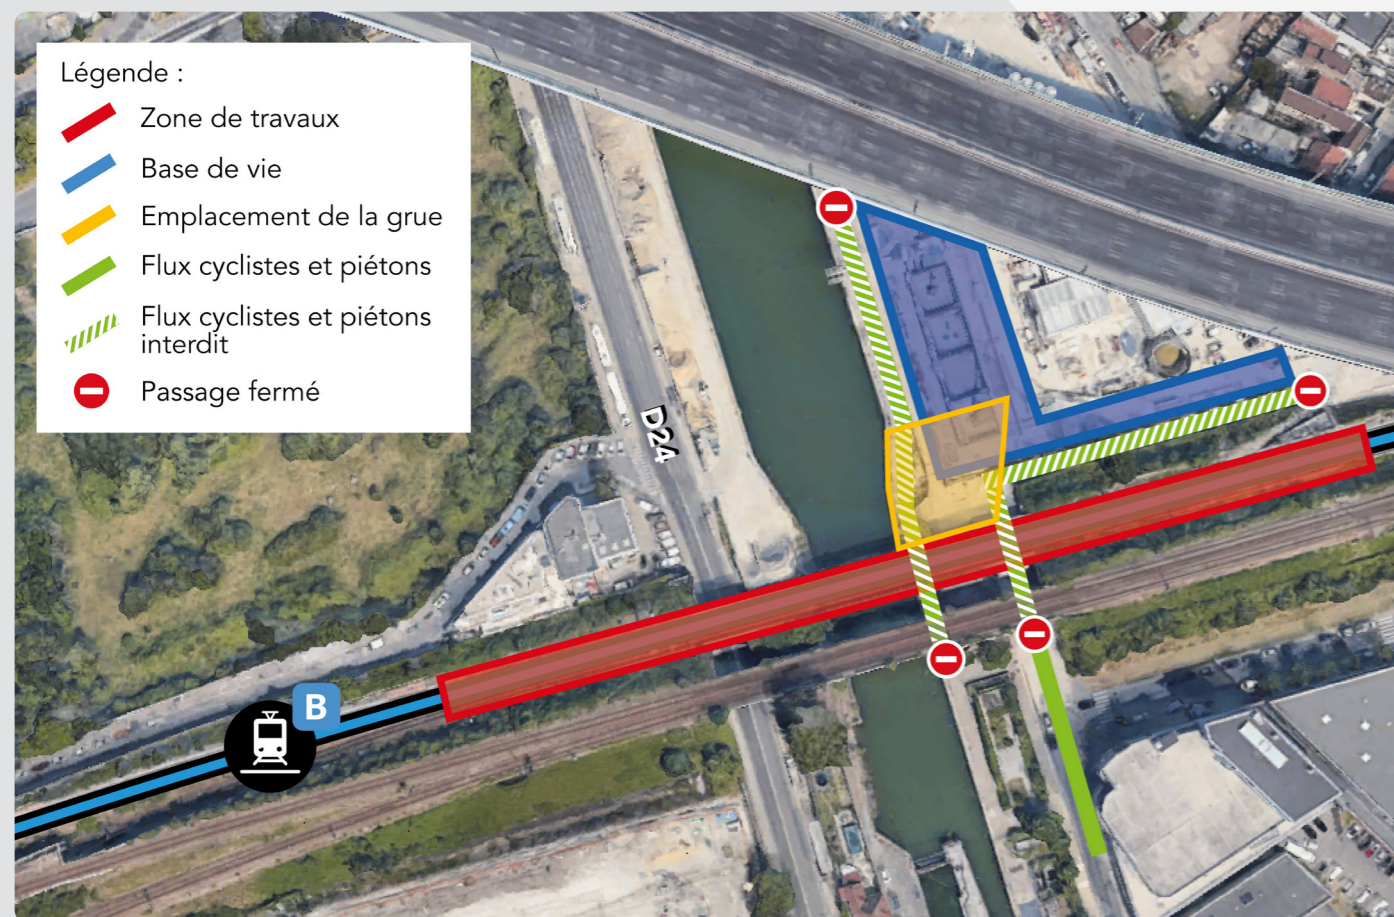

Fermeture totale de la piste cyclable et piétonne Quai Jean Marie Tjibaou à partir du Pont Pressensé jusque rue de l'Ecluse des Vertus et Chemin Latéral Nord.

Phase 3 - Travaux principaux, remplacement du tablier et réhaussement des ponts encadrants

En continu, du vendredi 07 août 2026 au soir au lundi 17 août au matin 2026



Fermeture totale de la navigation fluviale, de la route départementale n°24 sous le pont et du quai Jean Marie Tjibaou pour les voitures, cyclistes et piétons. **L'ancien tablier sera déposé, les deux nouveaux tabliers posés par grutage et les deux ponts encadrants seront réhaussés.**

Retrouvez les plans de déviations page suivante



Phase 2 - Carte de déviation pour les cyclistes et piétons



Déviation cyclable via :

- ➔ Place du Franc Moisin
- ➔ Avenue du Général De Gaulle
- ➔ Quai Adrien Agnès
- ➔ Quai Lucien Lefranc
- ➔ Quai Josette
- ➔ Passerelle Debord - Pierre Larousse

Phase 3 - Carte de déviation pour les véhicules, piétons et cyclistes



Déviation routière via :

- ➔ Rue Saint-Gobin
- ➔ Rue Waldeck Rochet
- ➔ Rue du Landy
- ➔ Rue Francis de Pressensé

 **Suivre le chantier**

Retrouvez ce chantier sur notre site internet SNCF Réseau en scannant ce QR Code :



Une question ?
Une remarque ?

Une adresse mail est dédiée au projet :
pontsaintdenis@reseau.sncf.fr
N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions.

